



**Помощь студентам
онлайн! Без посредников!
Без предоплаты!
<http://diplomstudent.net/>**

**Кейс: Планирование ресурсов и затрат по проекту строительства
детской площадки**

В селе Карабаевка Цильнинского района Ульяновской области проживает 265 семей, при этом 99 семей имеют детей дошкольного и младшего школьного возраста. По этой причине администрацией сельского поселения принято решение о реализации проекта строительства детской игровой площадки. Основные виды расходов по проекту:

1) бухгалтерское сопровождение проекта по договору гражданско-правового характера — 13800 руб.;

2) юридическое сопровождение проекта по договору гражданско-правового характера — 16800 руб.;

3) подготовка территории под строительство площадки (засыпка ям, выравнивание площадки, ограждение):

3.1) оплата труда 100 человеко-часов — 11200 руб.,

3.2) приобретение песчаного грунта — 8000 руб.;

3.3) приобретение пиломатериалов для ограждения — 15950 руб.;

4) установка и наладка игрового комплекса и отдельных элементов детской площадки:

4.1) оплата труда 150 человеко-часов — 16800 руб.,

4.2) приобретение базовой комплектации игрового комплекса и отдельных элементов детской площадки (детский игровой комплекс,

карусель, качели на пружине «Джип», качели одноместные, скамейки (2 шт.) — 167 040 руб.;

5) строительство беседки и песочницы:

5.1) оплата труда 150 человеко-часов — 16800 руб.,

5.2) приобретение материалов (профнастил, брус, доска обрезная, столбы) — 36050 руб.;

б) благоустройство территории детской площадки 100 человеко-часов — 11200 руб.

Задание к кейсу:

Сформируйте смету и базовый план стоимости проекта.

Решение:

Составим смету затрат, таблица 1.

Таблица 1– Смета затрат на проект: Строительство детской игровой площадки

№ п/п	Статья затрат	Сумма, руб.
1	бухгалтерское сопровождение проекта по договору гражданско-правового характера	13800
2	юридическое сопровождение проекта по договору гражданско-правового характера	16800
3	подготовка территории под строительство площадки (засыпка ям, выравнивание площадки, ограждение), всего	35150
3.1	оплата труда 100 человеко-часов	11200
3.2	приобретение песчаного грунта	8000
3.3	приобретение пиломатериалов для ограждения	15950
4	установка и наладка игрового комплекса и отдельных элементов детской площадки, всего	183840
4.1	оплата труда 150 человеко-часов	16800
4.2	приобретение базовой комплектации игрового комплекса и отдельных элементов детской площадки (детский игровой комплекс, карусель, качели на пружине «Джип», качели одноместные, скамейки (2 шт.))	167040
5	строительство беседки и песочницы, всего	64050
5.1	оплата труда 150 человеко-часов	16800
5.2	приобретение материалов (профнастил, брус, доска обрезная, столбы)	36050
5.3	благоустройство территории детской площадки 100 человеко-часов	11200
	Итого	313640

Подготовка базового плана по стоимости представляет собой установление отношения между оценкой стоимости и временными параметрами проекта. Для выстраивания этого соответствия требуются четкие критерии, которые определяют как события проекта, инициирующие выплаты по включенным в элементам (статьям) расходов, так и время, проходящее между инициирующими событиями и соответствующими им выплатами.

Графическое отображение базового плана стоимости. S-кривая является широко распространенным способом показа базового плана стоимости, выражаемого в виде накопительных расходов.

Изобразим графически базовый план стоимости проекта: Строительство детской игровой площадки, при условии, что планируется построить площадку 3 месяца. Расходы по месяцам представлены в таблице 2.

Таблица 2- Расходы по месяцам на проект: Строительство детской игровой площадки

№ п/п	Статья затрат	Сумма, руб.
1	Расходы в первый месяц всего	65750
1.1	подготовка территории под строительство площадки (засыпка ям, выравнивание площадки, ограждение):	35150
1.2	бухгалтерское сопровождение проекта по договору гражданско-правового характера	13800
1.3	юридическое сопровождение проекта по договору гражданско-правового характера	16800
2	Расходы во второй месяц всего	183840
2.1	установка и наладка игрового комплекса и отдельных элементов детской площадки, всего	183840
3	Расходы в третий месяц всего	64050
3.1	строительство беседки и песочницы, всего	64050
4	Итого расходы	313640

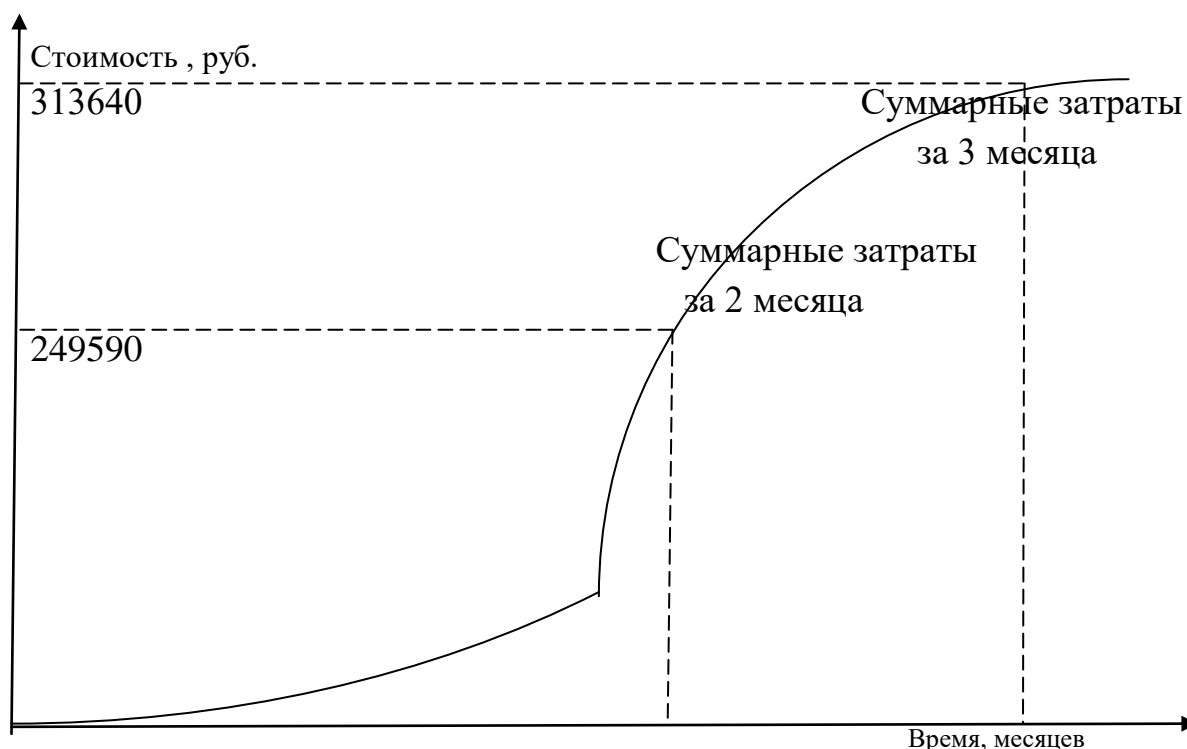


Рисунок 2 - Базовый план по стоимости проекта (S-кривая):
Строительство детской игровой площадки
